

新病院通信

～Vol.7～



現場からのお知らせ

開院に向けた建築工程の遅れが生じており、対策として12月より作業時間の延長を実施しております。近隣の皆さまには大変なご迷惑をお掛けしておりますが、照明や騒音等周辺環境に十分配慮した上で作業を進めて参りますので、ご理解・ご協力をお願い致します。



工事進捗報告 (11月末日時点)



全体写真(病院北側より撮影)




病院南西側からの現場写真



病院南東側からの現場写真



12月工事スケジュール

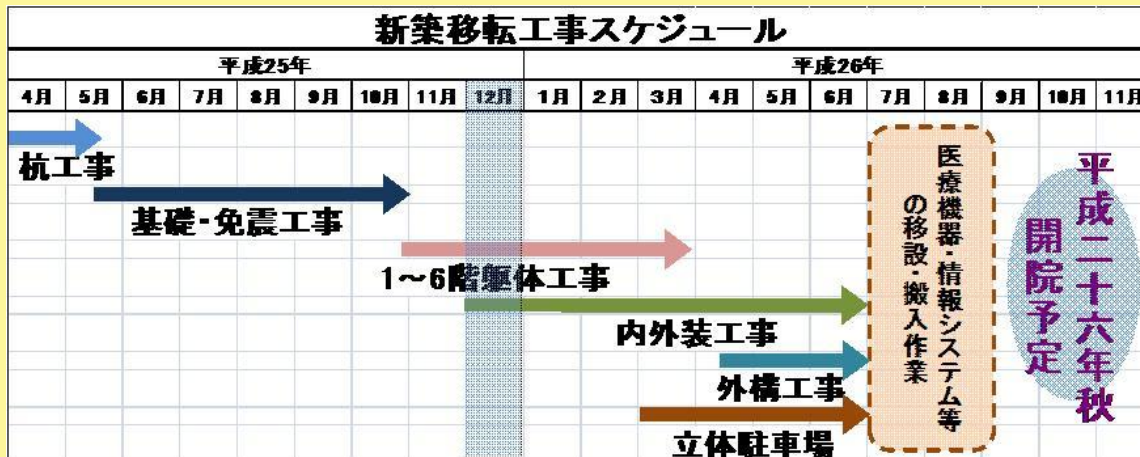

11月半ばまでに、全工区において基礎工事・免震装置の設置を完了し、現状では免震階の躯体工事に取り掛かっております。各工区の状況に合わせ、柱・梁配筋、梁・スラブ組立、コンクリート打設等の作業を随時進めて参ります。
