

新病院通信

～Vol.10～



現場からのお知らせ

現状3ヶ月程度の遅れが生じており、その対策として作業時間の延長させて頂いております。近隣の皆さまには大変なご迷惑をお掛けしておりますが、照明や騒音等周辺環境に十分配慮した上で作業を進めて参りますので、ご理解・ご協力をお願い致します。



工事進捗報告



全体写真(病院北西より撮影)




1階天井部分のコンクリート打設



外部足場組立状況



3月の工事スケジュール

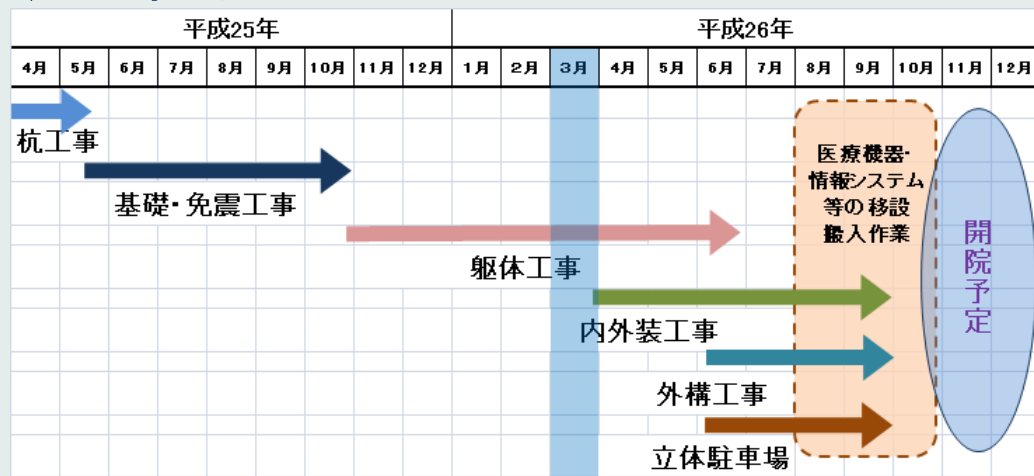

2月末にて1階部分に関して壁・梁スラブの型枠組立、梁スラブ配筋、コンクリート打設等を実施し、1階立上り躯体の50%程度を終了しております。3月は1階立上り躯体のコンクリート打設完了を目指すと共に、完了部分の内装工事にも着手して参ります。
