

新病院通信

～Vol.12～



現場からのお知らせ

病院北西付近での救急搬入道路工事に関して、重機を使用した掘削工事を行っており、期間中に騒音・振動等が発生する場合があります。近隣にお住まいの皆さまには大変ご迷惑をお掛けしておりますが、何卒ご理解・ご協力をお願い致します。



工事進捗報告



全体写真(病院北西より撮影)




1階天井部分の配管工事



救急搬入道路工事



5月の工事スケジュール

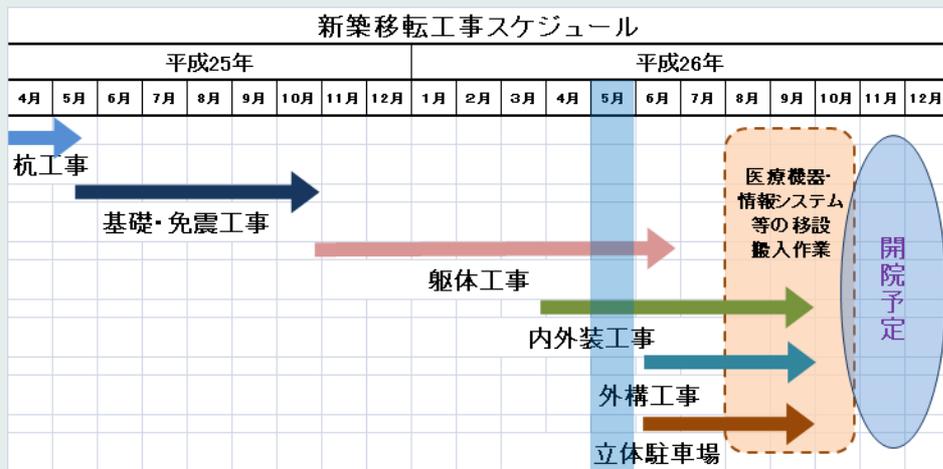

4月末にて、1・2階立上り躯体のコンクリート打設が完了し、3階立上り躯体についても30%程度完了しております。また、1階については、各種設備工事や内装仕上げを進めております。5月は、3階立上り躯体のコンクリート打設、1・2階内装仕上げと共に、外壁部分の工事に着手していく予定です。また、救急搬入路等の外構工事についても随時着手していきます。
