

# 新病院通信

～Vol.14～



## 現場からのお知らせ

工事計画の遅延により、日曜作業を実施させて頂くこととなりました。解体工事等の大きな騒音が発生する作業は行わず、時間は18時迄と致します。近隣にお住まいの皆さまには大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解・ご協力をお願い致します。



## 工事進捗報告(7月末)



全体写真(病院北西より撮影)




外観写真(病院南西より撮影)



2階通路



## 7月の工事スケジュール

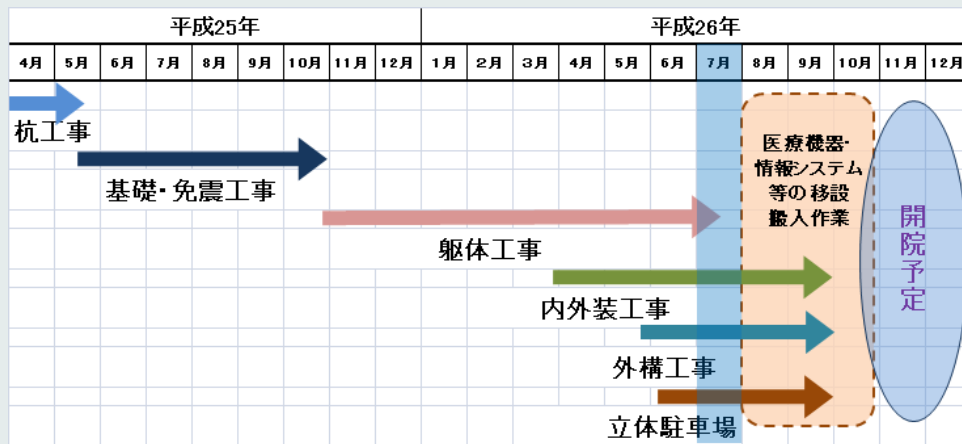

6月末にて、5階躯体工事が約8割、2・3階の壁ボード貼りが5割程度完了しております。外壁では一部にてタイル貼りを開始し、外構では既設ブロックの撤去及び擁壁関係工事を進めております。7月は残りの躯体工事の完了と1階天井ボード貼り及び各階壁ボード貼り等を行って参ります。また、7月下旬にてキュービクル及び発電機の搬入・据付を予定しております。
