

新病院通信

～Vol.8～



現場からのお知らせ

・開院に向けた建築工程の遅れが生じており、対策として12月より作業時間の延長を実施しております。近隣の皆さまには大変なご迷惑をお掛けしておりますが、照明や騒音等周辺環境に十分配慮した上で作業を進めて参りますので、ご理解・ご協力をお願い致します。



工事進捗報告 (12月末日時点)



全体写真(病院北側より撮影)




外部足場の組立状況



病院北東側からの現場写真



1月工事スケジュール

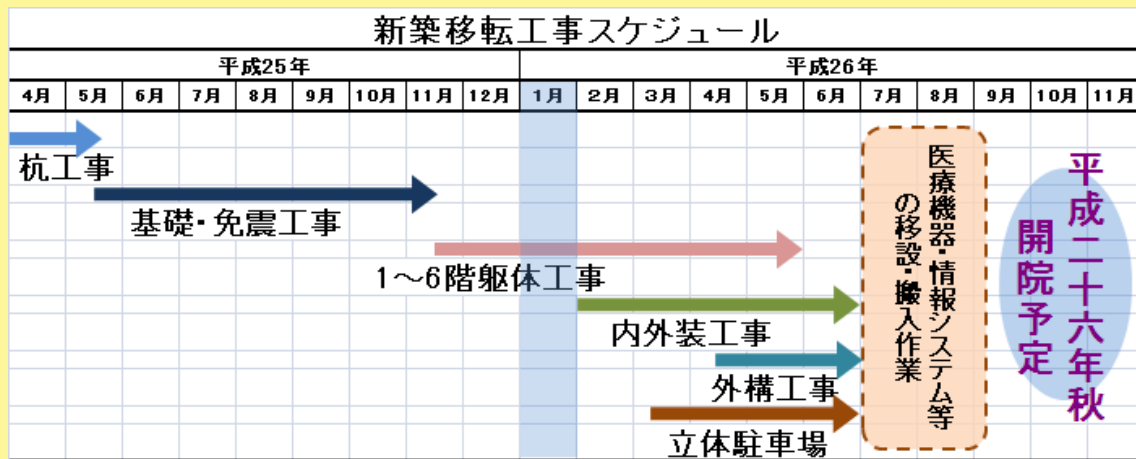

11月半ばより躯体工事を開始しており、12月末迄で免震階上部のコンクリート打設が3分の1程度完了しております。建設関係の全国的な人手不足で工事の遅れが発生しておりますが、職人の増員を図りつつ、1月末迄に1階立上り躯体の着手を目指して参ります。
