

# 新病院通信

～Vol.5～



## 現場からのお知らせ

○工事用地の西側道路(市道塩釜神社線)について、8月20日から10月31日まで、資材搬入用のゲートを設置しております。4tトラックで1日平均2台前後の出入りが発生しております。近隣の皆さまには大変ご迷惑をお掛けしておりますが、何卒ご協力お願い致します。



## 工事進捗報告 (8月末日時点)



全体写真(病院北側より撮影)




ポンプ車2台によるコンクリート打設



打設完了後の地下水槽の様子



## 9月工事スケジュール

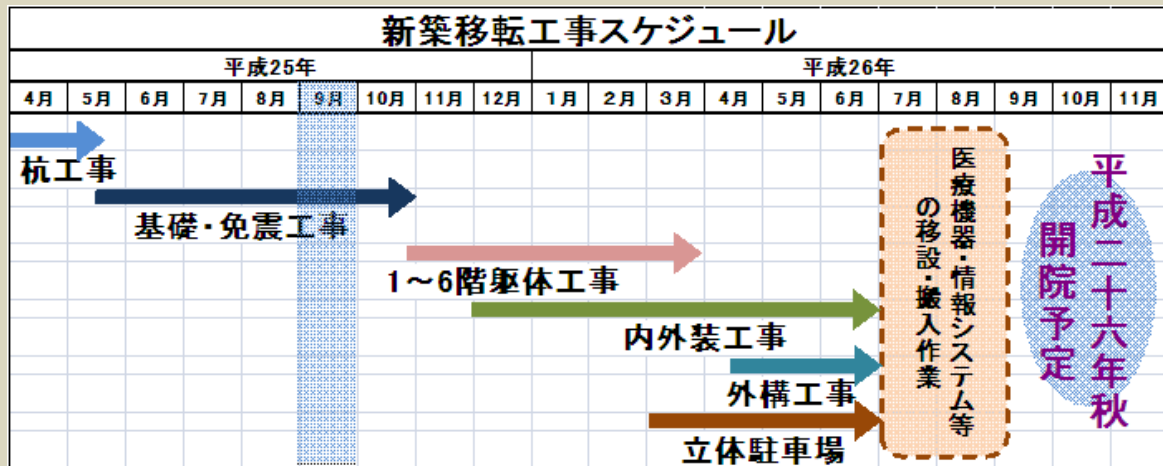

8月同様に、残り工区の基礎・地中梁の配筋、型枠工事、コンクリート工事を行います。また、一部の工区で免震ピット床の耐圧盤のコンクリート打ちを実施し、下旬頃に免震装置をセットする予定です。
