

新病院通信

~Vol.1~



現場からのお知らせ

- 平成25年5月7日より伊予銀行南側の土地を賃借し、工事車両進入路を増設致します。
- 周辺道路への砂埃等に関して、道路への散水、車輪部分の水洗いの徹底等、対策を行います。



工事進捗報告 (4月末日時点)



全体写真(病院北側より撮影)




杭打ちに向けた掘削作業風景



杭打ちは全74本中約60%完了



5月工事スケジュール

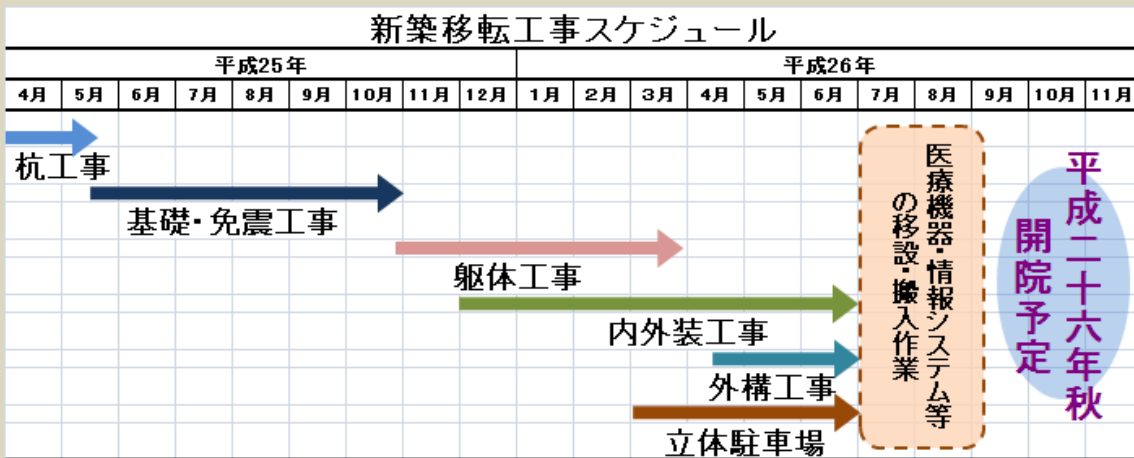

5月前半は引続き杭打ち作業を行い、現状では5月半ばまでに全74本を完了する予定です。その後は、免震層の掘削作業に移り、北側部分より1次掘削、2次掘削と作業を進めて参ります。
