

# 新病院通信

～Vol.6～



## 現場からのお知らせ

○工事用地の西側道路(市道塩釜神社線)について、8月20日から10月31日まで、資材搬入用のゲートを設置しております。4tトラックで1日平均2台前後の出入りが発生しております。近隣の皆さまには大変ご迷惑をお掛けしておりますが、何卒ご協力お願い致します。



## 工事進捗報告 (9月末日時点)



全体写真(病院北側より撮影)




病院東側からの現場写真



免震装置を設置しました



## 10月工事スケジュール

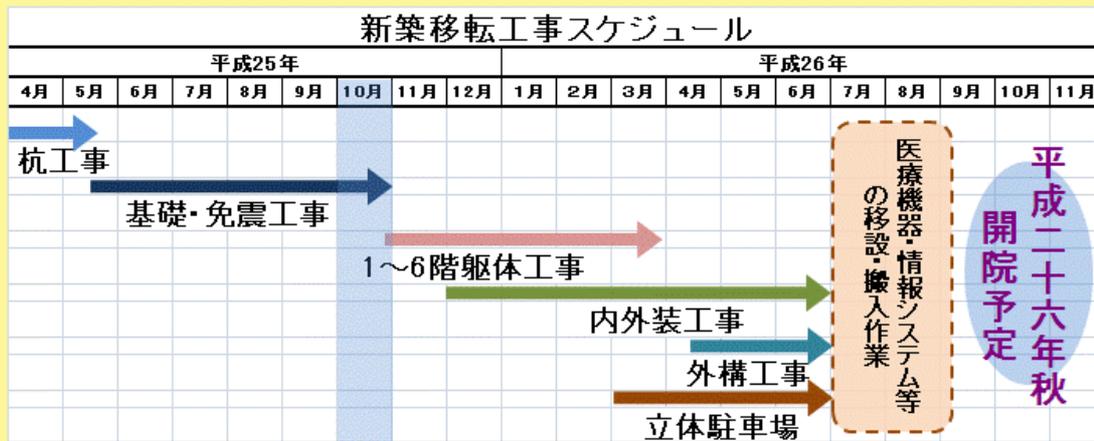

9月に引き続き、残り工区の基礎・地中梁のコンクリート打設をすべて終了し、埋戻し及び免震ピットの床になる耐圧盤のコンクリートを打設を行い、免震装置を設置していきます。
