坂出市立病院

新病院通信

～Vol.11～

現場からのお知らせ

現状3ヶ月程度の遅れが生じており、その対策として作業時間を延長させて頂いております。近隣の皆さまには大変なご迷惑をお掛けしておりますが、照明や騒音等周辺環境に十分配慮した上で作業を進めて参りますので、ご理解・ご協力をお願い致します。

工事進捗報告

全体写真（病院北西より撮影）

玄関ホールの吹抜け部分

1階西側の壁面部分

4月の工事スケジュール

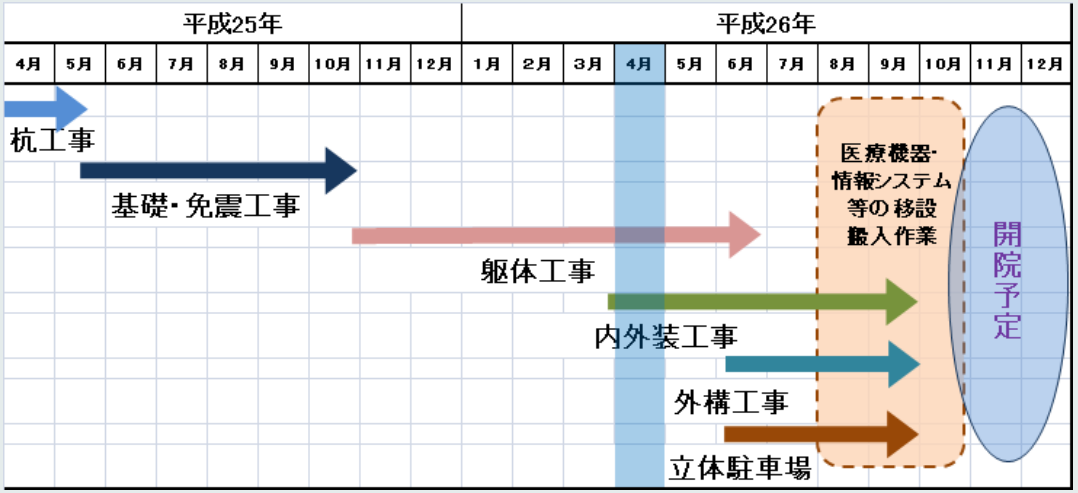

3月末にて、1階立上り躯体のコンクリート打設が完了し、2階立上り躯体についても30%程度完了しております。また、可能な工区よりアルミサッシや軽鉄間仕切の設置など内装仕上にも着手しております。4月については、2階立上り躯体のコンクリート打設完了と1階内装工事の完了を目標に作業に当たって参ります。

発行：坂出市立病院　庶務課
